



LAUDO PERICIAL

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E TESTE DE EQUIPAMENTO



1. OBJETIVO

Laudo Técnico para Certificação de Inspeção em equipamento nos termos da Legislação Federal relativa à Segurança e Saúde no Trabalho Portuário.

ART vinculada: 8163011-6

AVALIADOR TÉCNICO	
NOME:	FORMAÇÃO:
Leandro João da Silva	Tecnólogo em Manutenção de Máquinas e Equipamentos.
CREA-SC:	CONTATO:
099836-7	(47)98859-5380, e-mail: leandro.silva@apmterminals.com

2. REFERÊNCIAS

Item 29.3.5.10 da Norma Regulamentadora NR29 relativos à Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, aprovada pela Portaria nº 53 de 17 de dezembro de 1997 e alterada pela Portaria SIT 158 de 10 de abril de 2006.

29.3.5.10 Os equipamentos terrestres de guindar e os acessórios neles utilizados para içamento de cargas devem ser periodicamente vistoriados e testados por pessoa física ou jurídica devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

3. DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO

Equipamento de segurança para içamento de pessoas e resgate em altura.

TIPO:			TAG:
Safty Cage (Cesto Suspenso, segurança para içamento de pessoas)			Safty Cage - 02
MODELO:			FABRICANTE:
SC-02			USIVIC
Nº do Projeto	ANO:	TARA:	CAPACIDADE:
20180402.00	2018	3040 kg	SWL – 1200 kg



Figura 1. Safty Cage - 02

4. INSPEÇÃO

Com a finalidade de avaliar o estado do equipamento antes da realização do teste operacional, e para certificar de que o mesmo apresenta as condições mínimas de segurança para sua execução, foi realizada uma inspeção inicial.

4.1.INSPEÇÃO: ITENS VERIFICADOS

O check-list a continuação apresenta o resultado da vistoria inicial realizada no equipamento:

ESTRUTURA e SISTEMA MECÂNICO			
No.	Item	OK	Não OK
1	Verificar corner casting quanto a deformações, corrosão e trincas	X	
2	Verificar integridade da estrutura quanto a trincas e oxidação	X	
3	Verificar estado geral das corrente e manilhas de proteção contra quedas	X	
6	Verificar teto quanto a infiltrações	X	
7	Verificar portões de acesso quanto ao correto funcionamento	X	
8	Verificar estado geral da base de apoio e do piso de carga	X	

4.2.INSPEÇÃO:

Ao término da inspeção foi constatado que o equipamento satisfaz as condições básicas operacionais. Não foram observadas anormalidades nos dispositivos mecânicos ou estruturais, durante nem após a inspeção.

5. CONCLUSÃO


Avaliando suas condições, o equipamento supracitado está em plenas condições de operação, os itens pendentes acima foram corrigidos após o termino das inspeções.

Em testemunho do acima citado, Certifico a Inspeção do equipamento, o presente é acobertado pela respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida de acordo com os parâmetros legais do CREA-SC – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina, que o valida para todos os fins legais a que se destina.

Sem mais,

Itajaí – SC, 09 de março de 2022.

ANEXOS

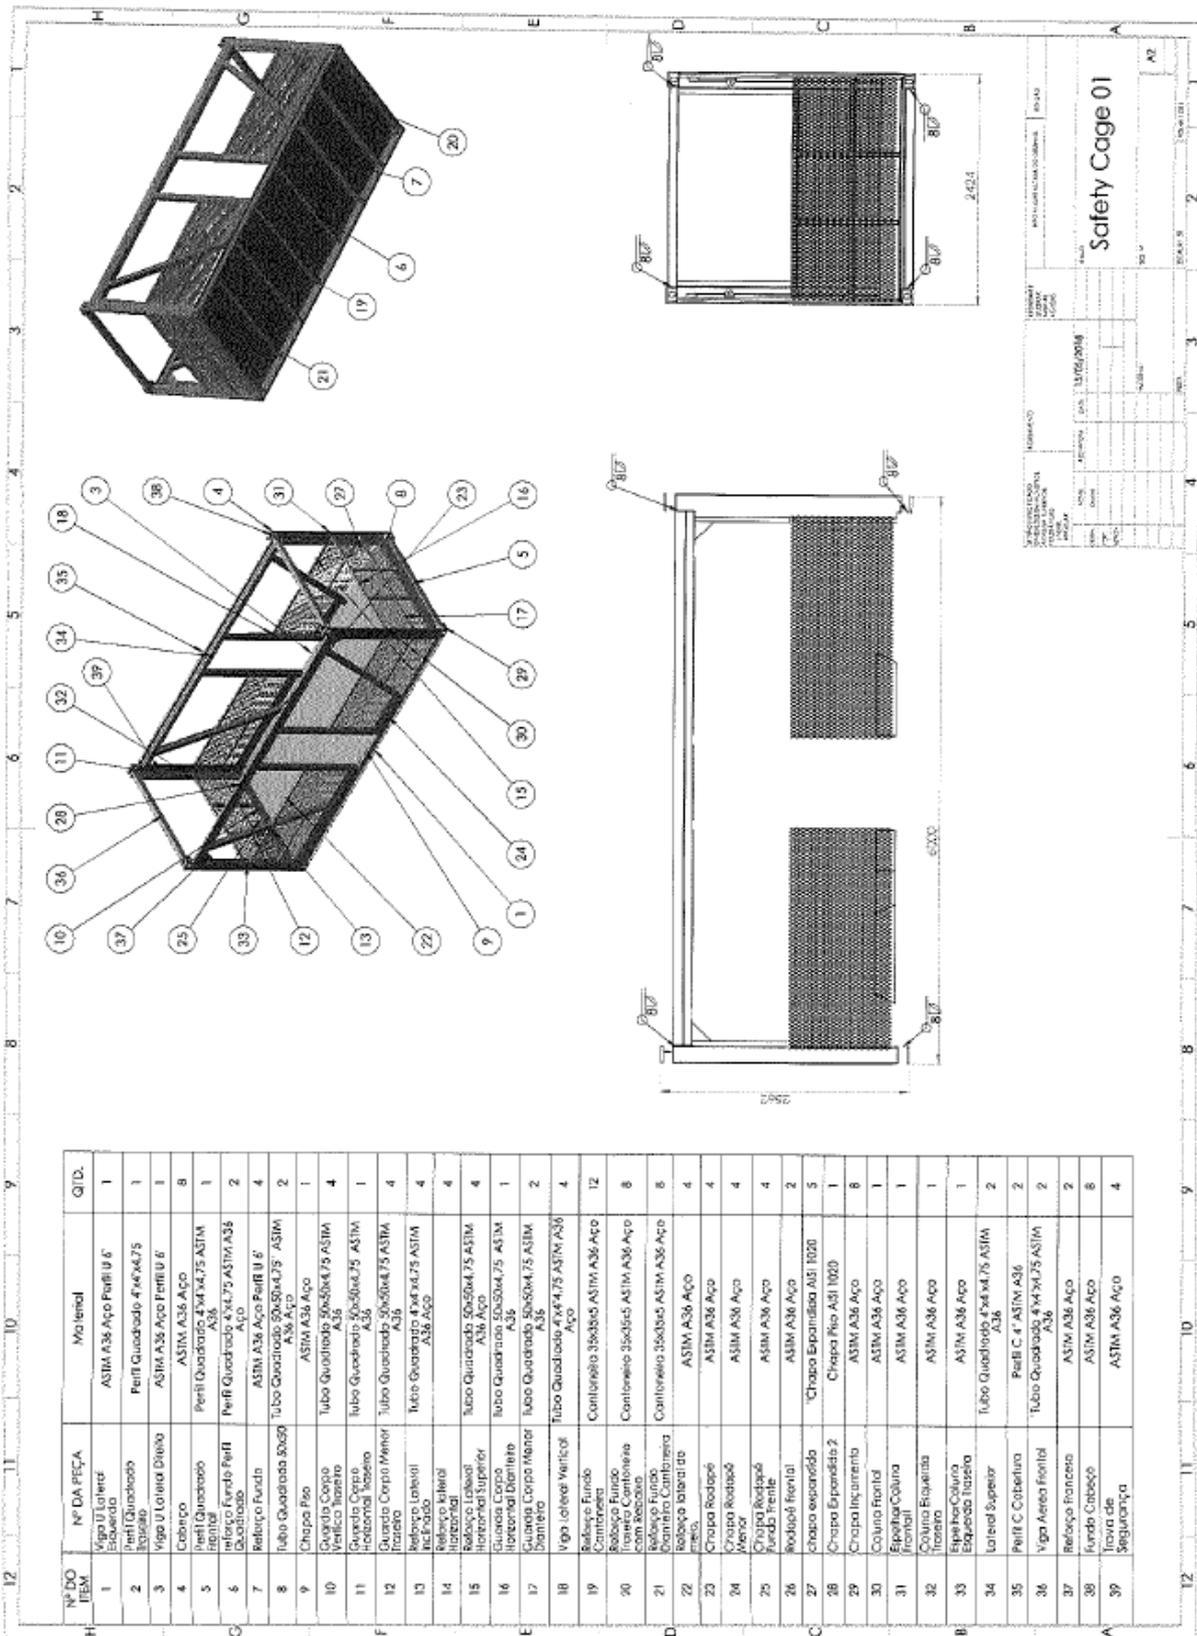

Anexo 1 – desenho do projeto de fabricação

ANEXOS



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO
6558128-3

1. Responsável Técnico
FLAVIO ANTONIO DA SILVA E SOUSA
Título Profissional: Engenheiro Mecânico
RNP: 0804751773
Registro: 145684-4-SC

Empresa Contratada: _____
Registro: _____

2. Dados do Contrato

Contratante: APM TERMINALS ITAJAÍ S.A. Endereço: AVENIDA CORONEL EUGENIO MULLER Complemento: Porto Itajaí Cidade: ITAJAÍ Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 7.500,00	Bairro: CENTRO UF: SC	CPF/CNPJ: 04.700.714/0001-63 Nº: 300 CEP: 88301-120
---	--------------------------	---

Ação Institucional: _____

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: APM TERMINALS ITAJAÍ S.A. Endereço: AVENIDA CORONEL EUGENIO MULLER Complemento: Porto Itajaí Cidade: ITAJAÍ Data de Início: 02/04/2018	Bairro: CENTRO UF: SC	CPF/CNPJ: 04.700.714/0001-63 Nº: 300 CEP: 88301-120
--	--------------------------	---


Data de Término: 31/07/2018
Coordenadas Geográficas: -26,9017 -48,6652

4. Atividade Técnica

Projeto	Fabricação	Inspeção
---------	------------	----------

Cesto Suspensor

Dimensão do Trabalho: 3,00 Unidade(s)



5. Observações

Cabele de Segurança de Içamento de Peças ("Safety Cage"), conforme normas NR-29, NR-12, ABNT NBR 8800:2003, Números das Safety cage: SC-02; SC-03; SC-04

6. Declarações

Disponibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
SENGE/SC - 13

8. Informações

- A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART:
TAXA DA ART PAGA EM 08/05/2018 NO VALOR DE R\$ 82,94
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br Fone: (48) 3331-2008  talcom@crea-sc.org.br Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

ITAJAÍ - SC, 08 de Maio de 2018



Jorge Oriárdim
Supervisor de Manutenção
APM TERMINALS



Flávio A. S. Sousa
Eng. Mecânico
RNP: 0804751773
CREA-SC 145684-4

Contratante: APM TERMINALS ITAJAÍ S.A.
04.700.714/0001-63

Anexo - 2 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto de fabricação

ANEXOS



Anexo – 3 imagem da placa de identificação

ANEXOS



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO
25 2022 8163011-6
Inicial Individual

1. Responsável Técnico
LEANDRO JOAO DA SILVA
Título Profissional: Tecnólogo em Manutenção de Máquinas/Equi
RNP: 2508455547
Registro: 099836-7-SC

Empresa Contratada: _____ Registro: _____

2. Dados do Contrato
Contratante: **APM TERMINALS ITAJAI SA**
Endereço: **AVENIDA CORONEL EUGENIO MULLER**
Complemento: **Porto de Itajai**
Cidade: **ITAJAI**
Bairro: **CENTRO**
UF: **SC**
CEP: **88301-120**
CFF/CNPJ: **04.700.714/0001-63**
NP: **300**
Valor da Obra/Serviço/Contrato: **R\$ 3.000,00**
Contrato: _____ Celebrado em: _____ Honorários: _____ Vinculado à ART: _____ Ação Institucional: _____ Tipo de Contratante: _____

3. Dados Obra/Serviço
Proprietário: **APM TERMINALS ITAJAI SA**
Endereço: **AVENIDA CORONEL EUGENIO MULLER**
Complemento: **Porto de Itajai**
Cidade: **ITAJAI**
Bairro: **CENTRO**
UF: **SC**
CEP: **88301-120**
CPF/CNPJ: **04.700.714/0001-63**
NP: **300**
Data de Início: **09/02/2022**
Data de Término: **31/12/2022**
Coordenadas Geográficas: **-26,9017 -48,8652**
Finalidade: **Industrial**
Código: _____

4. Atividade Técnica

Atividade	Inspeção	Vistoria	Laudo
Manutenção Plataforma elevatória			
	Inspeção	Vistoria	Laudo
		Dimensão do Trabalho:	1,00 Unidade(s)
Manutenção Empilhadeira			
	Inspeção	Vistoria	Laudo
		Dimensão do Trabalho:	4,00 Unidade(s)
Manutenção Guindastes móveis			
	Inspeção	Vistoria	Laudo
		Dimensão do Trabalho:	2,00 Unidade(s)
Manutenção Guindastes/gruas/guinchos			
	Inspeção	Vistoria	Laudo
		Dimensão do Trabalho:	2,00 Unidade(s)
Manutenção Empilhadeira			
	Inspeção	Vistoria	Laudo
		Dimensão do Trabalho:	11,00 Unidade(s)
Manutenção Caminhão			
	Inspeção	Vistoria	Laudo
		Dimensão do Trabalho:	23,00 Unidade(s)
Manutenção Reboque e semi-reboque			
	Inspeção	Vistoria	Laudo
		Dimensão do Trabalho:	24,00 Unidade(s)
Manutenção Acessórios para movimentação de carga			
	Inspeção	Vistoria	Laudo
		Dimensão do Trabalho:	11,00 Unidade(s)

5. Observações
Manutenção, vistoria, e teste de carga conforme normas NR12, NR20, ASME B30.2-2011

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) neste ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
AREA/ITAJAI - 17

8. Informações
A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA
Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 03/03/2022 | Registrada em: 21/02/2022
Valor Pago: R\$ 88,78 | Data Pagamento: 25/02/2022 | Nosso Número: 14002204000162443
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
Este ART está sujeito a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima.
ITAJAI - SC, 21 de Fevereiro de 2022


Leandro Joao da Silva
 Technical & Civil Infra Manager
 APM TERMINALS
 027.098.019/00
 Thiago A. Pereira
 Manutenção Supervisor
 APM TERMINALS
 04.700.714/0001-63

www.crea-sc.org.br f@crea-sc.org.br **CREA-SC**
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

Anexo 4. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
